



Försvarens årsredovisning 2001

Bilaga 2

Försvarens omstrukturering

FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING

1 BAKGRUND

Försvarsmaktens plan för omstruktureringen efter Förvarsbeslut 1996 redovisades i "*Budgetunderlag 1998 och särskilda redovisningar*" (Högkvarterets skrivelse 1997-02-28 23; 383:62561). Resultatet av omstruktureringen för 1997, 1998, 1999 och 2000 har återredovisats i Försvarmakten årsredovisning för respektive år.

Försvarsmaktens plan för den återstående omstruktureringen efter Förvarsbeslut 1996 har redovisats i "*Budgetunderlag 1999 och särskilda redovisningar*" (Högkvarterets skrivelse 1998-03-01 23 383:61471). I denna plan har också inarbetats de beslut som riksdagen och regeringen fattade under hösten 1997. Dessa beslut berörde i första hand Försvarmaktens skolorganisation.

Försvarsmaktens omstrukturering beslutat med regleringsbrev 2000-03-30 ingår i rapporteringen. Riksdagsbeslut 2001-05-16 ingår från och med halvårsrapporten år 2001.

Regeringen föreskriver i regleringsbrevet att Försvarmakten i budgetunderlaget skall redovisa en samlad plan för hur avveckling av krigsförband och grundorganisation skall genomföras. Planen skall omfatta bland annat tidsförhållanden och kostnader för att genomföra omstruktureringen.

Återstående omstrukturering efter Förvarsbeslut 1996 styrs inom Försvarmakten genom "*ÖB slutliga order avseende Försvarmaktens omstrukturering*" (Högkvarterets skrivelse 1998-01-19; 02 311:60434).

Pågående omstrukturering efter regeringens beslut 2000-03-30 styrs inom Försvarmakten genom "*ÖB sammanfattande order avseende Försvarmaktens omstrukturering*" (Högkvarterets skrivelse 2000-06-20; 02 300:67224) och kompletteringar efter riksdagsbeslut 2001-05-16 styrs inom Försvarmakten genom "*ÖB reviderade order avseende Försvarmaktens omstrukturering*" (Högkvarterets skrivelse 2001-06-28; 02 300:68181) **samt reviderad order avseende Försvarmaktens omstrukturering (komplettering med Högkvarterets skrivelse 2001-12-17; 02 300:73056).**

2 REDOVISNING AV TIDSPLAN OCH AVECKLINGSKOSTNADER

./Ubil 2.1

TIDSPLAN

I underbilaga 2.1 redovisas för varje förbandstyp tidsplaner när omstruktureringsuppdrag skall påbörjas och när de senast skall vara genomförda. Ansvarig ledning har handlingsfrihet att omstrukturera verksamheten tidigare. Planen utgår från att uppdragets sluttidpunkt är 12-31 angivet år. I kolumnen ”*Prognos/Anmärkning*” redovisas förändringar i förhållande till föregående redovisning med *fet kursiverad text*. Denna princip används genomgående i samtliga underbilagor.

Ett förband i *grundorganisationen* (motsvarande) anses vara avvecklat när:

- Kärnverksamheten har avslutats.
- All personal är avvecklad.
- Arbetsgivarens skyldigheter och befogenheter för civil uppsagd personal som ej avvecklats överförs till annat förband.
- Kvarstående verksamhet såsom t ex omförrädsställningar, avveckling av anläggningar, mark och fastigheter samt förnödenheter har överförs till annat förband.

Avveckling av förnödenheter, mark, fastigheter och anläggningar kommer således inte alltid att vara avslutade vid den tidpunkt då förbandet enligt definitionen anses som avvecklat.

AVECKLINGSKOSTNADER

Kostnaderna omfattar:

- Kostnader för insats- och grundorganisation från det att avveckling påbörjas till dess att förbandet är avvecklat.
- Kostnader för avveckling av personal. Huvuddelen av kostnaderna består av kostnader för SPB/SP. Planerade kostnader framgår av underbilaga 2.2.
- Kostnader för avveckling av förnödenheter.
- Kostnader för avveckling och avyttring av anläggningar och fastigheter.

Omstruktureringskostnader för förband som enligt försvarsbeslutet skall omorganiseras, till exempel kostnader för flyttning av personal och omfördelning av förnödenheter samt nyförhyrningar av anläggningar och fastigheter, ingår i de förbandstypsvisa uppdragen för vidmakthållande.

3 REDOVISNING PERSONALAVECKLING

./Ubil 2.2

Planen redovisar avveckling av anställd personal avseende tider och antal. Kostnaderna som redovisas i underbilaga 2.2 är en delmängd av de totala kostnaderna som framgår av den förbandstypsvisa redovisningen (underbilaga 2.1). Även om, som framgår av underbilagan, personalavvecklingen går *volymmässigt* bättre än planerat, så motverkas detta *till del* av att parallella nyanställningar av civil personal sammantaget gör, att det totala personalmålet f.n. inte *helt kunnat* innehållas. *Samtantaget bedöms dock personalavvecklingsmålen 2004 –12-31 kunna innehållas.*

Personalreduceringar för civil personal, som bedöms bli ett resultat av förändrad skol- och milounderrhållsorganisation, har inarbetats.

Kommentar till läget 2001-12-31

Allmänt

Bland yrkesofficerare som väljer att lämna FM *genom entledigande på egen begäran har en viss ökning i förhållande till 2000 skett. Yrkesväxlingsåtgärden har också i förhållande till planen nyttjats i större omfattning. Som en naturlig följd av den särskilda pensionen har antalet övriga avgångar, inkluderat ålders pension, minskat. Volymmålet för officerare har överskridits med knappt 200 officerare, detta trots stora avgångar. Detta har en teknisk förklaring då retroaktiva uppdateringar har gjorts i Försvarens PA system med innebörden att startläget 2001-01-01 i realiteten var högre än det inför planeringen ursprungliga värdet.*

Mot bakgrund av att Försvarens makt idag har ett antalsmässigt överskott på reservofficerare, samt ett stort antal reservofficerare med tjänstgöringsskyldighet baserat på äldre kungörelser och förordningar, föreligger ett avvecklingsbehov. Dessa avvecklingsåtgärder skall genomföras under 2002.

För civila visar avvecklingsresultatet, avseende snittårsarbetskraft, på ett överskridande med endast ca 0,7 % i förhållande till planen. I volymhänseende har målet överskridits med ca 167 årsarbetskrafter (ca 2%), detta måste dock ses i samband med att antalet tjänstlediga regelmässigt minskar under december månad vilket per automatik leder till ökning av årsarbetskrafter per 12-31 respektive år.

SP

För år 2001 har totalt 500 SP-avgångar prognostiserats, **491 av dessa har under året lämnat Försvarmakten.**

Yrkesväxling

Antalet yrkesofficerare som bedömdes yrkesväxla under 2001 **var** 150.
Huvuddelen av de **183** yrkesofficerare som till och med **2001-12-31** yrkesväxlat är i åldersläget 35-45 år.

Avgångsvederlag

De **38** avgångsvederlag som beviljats till och med **2001-12-31** är för officerare från före detta personalutvecklingsgrupper (PUG) samt från F 10. Avgångsvederlag kan **under kommande år** dessutom komma att erbjudas officerare vid F 16 med anledning av fattat nedläggningsbeslut.

Entledigade efter egen begäran

Bedömt antal *för hela 2001 har varit 380 officerare*. Utfallet till och med *2001-12-31* är *520* officerare. Det stora antal yrkesofficerare som begär entledigande på egen begäran, är kortsiktigt ekonomiskt fördelaktigt för FM, men kan på sikt innebära en icke önskvärd kompetensförlust.

Många tjänstlediga lämnar FM med begäran om entledigande på egen begäran efter att ha provat annan anställning under tiden för tjänstledigheten.

4 AVVECKLING AV FÖRNÖDENHETER

./Ubil 2.3

Högkvarteret har för regeringen redovisat de viktigaste resonemangen och slutsatserna inför avveckling av Försvarsmaktens förnödenhetsöverskott. Denna redovisning återfinns i HKV regeringsskrivelse 1999-10-01 bet 14 840:711 24. Här anges bl a att avvecklingen till sin huvuddel skall vara genomförd senast 2004-12-31.

Ett krigsförband anses vara avvecklat när:

- *Förbandet utgått ur krigsorganisationen (KOP).*
- *Förnödenheter är avvecklade/omfördelade.*
- *MAL är avvecklat.*

Enligt ovanstående kriterier, främst punkten förnödenheter, kommer inga förbandsvolymerna att vara slutligt avvecklade förrän dess förnödenheter (eller motsvarande volym av överskottslager) är avvecklade/omfördelade. Det innebär att förbandsvolymerna tidigast är avvecklade 2004-12-31.

Detta medför skillnader i förhållande till de volymer av olika förbandstyper som framgår av krigsorganisationstabellen i Kop. Där redovisas när krigsförbandet utgår ur krigsorganisationen, vilket i princip är när förbandet inte längre skall lösa sina krigsuppgifter.

Den materiel som skall avvecklas är såväl kvarvarande överskott efter tidigare försvarsbeslut som överskott som konsekvens av nu fattade riksdagsbeslut.

En snabb avveckling är angelägen av flera skäl. Ett av skälen är att Försvarsmaktens resurser tidigt skall kunna fokuseras på att utveckla och vidmakthålla

den ominriktade organisationen. Förutsättningen för detta är att genom rationalisering och effektivisering rationalisera av Försvarets förrådsverksamhet.

- *sänka kostnaderna för förrådshållning*
- *skapa ekonomiskt utrymme för utveckling av insatsorganisationen.*

Efter genomförd analys inriktas underhållsorganisationen på att under perioden fram till 2005 kraftigt sänka kostnader för förrådshållning genom att bl.a. successivt minska förrådsytan för insatsorganisationen med ca 1 miljon kvadratmeter.

Det övergripande målet är att slutföra avvecklingen så att den nya underhålls- och stödorganisationen kan nå en rationell förrådsställning före 2005.

Försvarets Materielverk erhöll uppgiften att upphandla extern avvecklingstjänst i juni 2000. Vald metod har under året reviderats mot en tydligare försäljningsroll för FMV i stället för köp av tjänst.

Orderläge

ÖB har 1999-05-19 i "Förslag till framtida struktur för Försvarets materielverk" för Regeringen bl.a. angett att

- *avvecklingen av förnödenheter är prioriterad och att denna avveckling skall ske så snabbt som möjligt*
- *materielsystem, som inte passar in i den framtida målbilden, skall koncentrerat avvecklas före 2006.*

ÖB har även 1999-10-01 för Regeringen redovisat en översiktlig bedömning avseende avvecklingsbehovens omfattning, behov av övervägningar, metoder, principer samt behov av eventuella regeringsbeslut.

ÖB bedömning och förslag har sedan utgjort underlag för proposition 1999/2000:30 och riksdagsbeslut.

Av regleringsbrev för Försvarets materielverk 2001 framgår vidare att avvecklingen skall genomföras skyndsamt. Alla möjligheter att vara färdig före 2004-12-31 skall tillvaratas i syfte att så tidigt som möjligt skapa ekonomiskt utrymme.

ÖB har därför i "Sammanfattande order avseende Försvarets materielverks omstrukturering", 2000-06-20, kap 10.2., tydligt pekat på behovet av att snabbt sänka kostnaderna för förrådshållning.

ÖB reviderade order avseende Försvarets omstrukturering, 2001-06-28, 02 300:68 181 fastställer C KRI ledningsprinciper, krav m.m.

Ledning av förnödenhetsavveckling

C KRI har med ovanstående som bakgrund 2001-01-31 fattat ett principbeslut om kommersiell strategi, principer för utövande av ledning samt en inriktning av ansvarsfördelning.

Under perioden intill 2001-12-31 leds avveckling av förnödenheter enligt nuvarande ledningsprinciper i enlighet med C KRI principbeslut.

2002-01-01 träder den nya underhålls- och stödorganisationen, FMLOG i kraft varvid chef för denna organisation bl.a. övertar uppdragsansvar för förnödenhetsflöde, separation, överföring av Försvarets förnödenhetsöverskott till parter utanför Försvarets samt slutlig omfördelning av insatsorganisationen.

FMLOG kommer troligen inte att från startdatum kunna verka med full kraft eller kompetens. Organisationens duglighet och förmåga utvecklas dock efter hand under omstrukturings- och avvecklingsperioden. Visst regionalt ledningsstöd bör därför finnas även efter 2001-12-31 intill det att FM LOG kan verka med full kraft.

Ledning av avveckling av förnödenheter regleras HKV skrivelse "Avveckling av övertaliga förnödenheter (Principbeslut)", HKV 2001-01-31 (bet 14 840: 60474). Därutöver regleras skallkrav m.m. i HKV skrivelse "Uppgifter, krav samt riktlinjer m.m. för avveckling av Försvarets överskotts-förnödenheter", HKV 2001-05-10 (bet 14 840:61311).

Sammanfattning av ovan nämnda skrivelser

Handlingarna riktar sig till avvecklingsprocessens samtliga aktörer och skall ge de uppgifter, bestämmelser, riktlinjer, anvisningar samt ställa de krav som behövs för att kunna;

- leda överföring av insatsorganisationens överskotts-förnödenheter från underhållsorganisationens förråd till de centrala avvecklingsterminalerna*
- besluta om destruktion av förnödenheter som inte anses uppfylla försäljningskriterier*
- genomföra försäljningar i enlighet med Försvarets handlingsregler*
- upphandla destruktion i enlighet med Försvarets handlingsregler*

- *övergripande styra verksamhet för avvecklingsterminaler*
- *skapa förutsättningar för beslut och ledning av avveckling*
- *ensa verksamhet och dess tillämpning*
- *utöva kontroll över förnödenheter klassade som krigsmateriel, omsluts av slutanvändaråtaganden, berörs av systemsäkerhets- och miljökrav m.m.*

Handlingarna refererar också till den beställning som lagts på Försvarets materielverk i vilken Försvarets materielverk ansvarar för kvalitet och uppgifter enligt samordningsavtal och därutöver enligt nedanstående utdrag ur beställning.

”Genomför periodiskt återkommande försäljning, följ härvid marknadens utveckling samt föreslå fortlöpande förändringar både vad avser försäljningsperioder och kommersiellt tillvägagångssätt.

På anmodan från HKV KRI UH Avv genomföra och avrapportera analysuppgifter.

FMV ansvarar vidare för:

- *att skyndsamt genomföra system- och miljöanalyser samt att tillse att mottagaren erhåller sådan information eller kunskap att kraven på systemsäkerhet och miljö tillgodoses*
- *att upprätta avvecklingsskrivelser*
- *att genomföra registervård inom centrala resursledningssystem för vilka FMV ansvarar*
- *att genomföra utsökningar*
- *att genomföra underhållsberedningar för system som endast skall delutgallras och därvid föreslå lagersänkning*
- *att med stöd av RESMAT avvecklingsuppdrag och fattade avvecklingsbeslut utgallra och till centralt avvecklingsförråd intransportera utgallrad reservmateriel*
- *att genomföra underhållsberedningar samordnat med försäljningsinnehållet*
- *att utarbeta kontrakt samt uppföljning av dessa*
- *att samordna kontakter med en eller flera från Försvarmakten fristående aktörer*
- *att säkerställa att ingångna slutanvändaråtaganden beaktas*
- *att upprätta klassningskompetens avseende krigsmateriel (tilläggsuppgift)*
- *att upprätta systemsäkerhetsregister med ”helpdeskfunktion” för systemsäkerhetsfrågor (tilläggsuppgift).*

Erfarenheter samt gränssättande framgångsfaktorer

Ny förrådsställningsprincip

Överbefälhavaren har fattat beslut om en ny försvarsmaktsgemensam underhållsorganisation med bland annat ändrad förrådsställningsprincip av insatsorganisationen.

Hur insatsorganisationens förband skall förrådsställas har tidigare beslutats (central samt arsenalsförråd). Däremot är det inte ännu slutligt klarlagt hur stor insatsorganisationens förnödenhetsmängd skall bli samt var förnödenheterna skall förrådsställas inom riket. Fördelning av förnödenhetsbeståndet baserat på nuvarande operativa verk kan komma att omprövas med anledning av kraven på ökad rationalitet, kostnadssänkning samt förändrade beredskapskrav. En omfattande del av FM:s befintliga förråd blir inte längre användbara därför att de ligger på fel plats, är för små eller för orationella för modern förrådshantering.

Frånvaron av en samlad riksförrådsplan innebär bl.a. att

- förnödenheter får mellanlagras*
- uppsägningar av i framtiden inte behövliga förråd får ske senare än vad som hade varit möjligt*
- investeringsbehov inte har identifierats och därmed saknas finansieringsplan.*

En riksförrådsplan behöver snarast tas fram.

Behovsättning av insatsorganisation 2004

Efter hand som nya och omorganiserade förband till sin struktur och målsättning är klara genomförs behovsättning av i förbanden ingående förnödenheter. Denna process pågår och är inte avslutad. Detta innebär att det totala överskottet inte kan urskiljas från de totala tillgångarna. Förnödenheter som reserverats för att ingå i de nya förbanden tenderar att till sin volym bli relativt stort. Arbete bedrivs fortlöpande för att ur tillgångarna subtrahera ut förnödenheter som inte bedöms bära mot målbilden. Denna metod är mycket arbetskrävande och leder endast i liten omfattning mot avvecklingsmålet. För att tidsplanerna skall hålla krävs därför att arbetet med behovsättningen forceras och att viss risktagning kan accepteras.

Även de förnödenheter som avses överföras till de Baltiska staterna intill 2004-12-31 måste identifieras och redovisningsmässigt separeras från tillgångarna. Detta arbete pågår och bedöms kunna vara slutfört under 2002. Redovisnings-systemens ålder och ursprungliga syfte är dock en begränsande faktor i detta arbete.

Överlåtelse av överskottsförnödenheter till parter utanför FM

Försvarens avveckling av överskottsförnödenheter har, förutom utgallring genom försäljning och destruktion, även skett genom:

- *överföring till andra statliga myndigheter*
- *gåva till humanitärt bistånd*
- *gåva till frivilliga försvarsorganisationer*
- *gåva till barn- och ungdomsverksamhet*
- *gåva inom ramen för bilateralt säkerhetsfrämjande stöd till Estland, Lettland och Litauen*
- *gåva till museal verksamhet*

Överföring till vissa statliga myndigheter (Räddningsverket och Svenska Kraftnät) samt det bilaterala säkerhetsfrämjande stödet till Estland, Lettland och Litauen har inneburit att signifikanta mängder övertaliga förnödenheter kunnat avvecklas till rimlig arbetsinsats och rimlig kostnad.

Exempelvis har 32 000 kubikmeter mängdmateriel (488 långtradare / 4 720 000 artiklar) levererats till Estland, Lettland och Litauen sedan augusti år 2000.

Vad gäller övriga överföringar/gåvor, av ett stort antal olika förnödenheter, har arbetsinsatsen varit omfattande men utflödet begränsat i volym räknat.

År 2002 kommer gåvor/överföringar till part utanför Försvarens makten koncentreras till de insatser som medför att signifikanta volymer avvecklas med rimlig arbetsinsats och till rimlig kostnad.

FM har f.n. inte resurser, förutom för stickprovskontroller, att följa upp ingångna överlåtelseavtal med bl.a. humanitära hjälporganisationer.

Personella avgångar, kompetensbrist

Avvecklingstakten kan komma att störas m.a.a. personella avgångar, nya eller ändrade förutsättningar inom såväl planerande som genomförande led. Även personalomsättning och avgångar vid FMV påverkar såväl avvecklingstakt som avvecklingskvalité.

Spontanavgångar och pensionsavgångar, som inte får återbesättas, innebär eftersläpningar i omstruktureringen. Detta påverkar förnödenhetsavvecklingen och säkerheten i bl.a. FM:s tillgångsredovisning av förnödenheter.

Belastningen är extra hård på landets mellersta del. Här föreligger en klart högre konkurrens från den civila marknaden om den civila personalen än inom övriga regionen. Underhållsorganisationen inom landets mellersta del belastas också extra hårt m.a.a. insatserna för säkerhetsfrämjande stöd av de baltiska staterna samt upprättande och iståndsättande av internationella förband.

För att inte fördröja avvecklingen och på så sätt förorsaka förrådshållningskostnader på sikt bör återanställning snarast ske.

Ålderstiget redovisningssystem – nya redovisningskrav

En begränsande faktor vid förnödenhetsavveckling är FM ålderstigna resursledningssystem. De är ursprungligen konstruerade för att tillgångsredovisa försvarsmaktens förnödenheter knutna till krigsförband i en gammal grundorganisationsstruktur. Systemet är byggt för att årsvis avisera krigsorganisationen vilket innebär att förändringar under löpande år är mycket svåra att åstadkomma. Systemet saknar dessutom loggfunktion för att klara av beordrad återredovisning.

Kompetensbrist och rekrytering

Ledningen av FM förnödenhetsavveckling kräver tillgång på kompetens främst inom området förvaltning och teknik. Efter senare års stora avgångar inom dessa kompetensområden är det mycket svårt att ersätta uppkomna vakanser, främst vad avser marin-, och flygvapenofficerare i nivå tre. Även i genomförandeorganisationen är kompetenstillgången en hämmande faktor. Detta märks främst vad avser ammunitionsutbildad personal. Det senare innebär att utlämningskapaciteten blir en begränsande faktor vid ammunitionsavveckling.

Det är vidare ytterst viktigt att de kurser för förrådsmän, förrådsförmän och förrådsförvaltare som tidigare genomförts av FMUHC även fortsättningsvis genomförs. Detta inte minst mot bakgrund av de påpekanden som kommit efter REV kontroll.

Materiel för tillväxt

I nuvarande planering för avveckling är inte FM MME för tillväxt inräknade. Det är därför av yttersta vikt att ett beslut om att avveckla dessa fattas i närtid. En omfattande analys av konsekvenserna av ett sådant beslut är påbörjad och beräknas bli klar i v 204. Det är inte uteslutet att ett sådant beslut kommer att försena sluttidpunkten för avvecklingens genomförande samt att det i det korta perspekti-

vet kommer att kräva mer resurser såväl personellt som ekonomiskt. Besparingen av att forcera denna avveckling bedöms kunna få sitt utfall först 2006.

5 NEDLÄGGNING AV ANLÄGGNINGAR SAMT AVVECKLING AV FASTIGHETER

./Ubil 2.4

5.1 Nedläggning av anläggningar¹

Försvarsmaktens Nedläggningsplan Anläggningar redovisar tidsplan för avveckling av anläggningar (enl ubil 2.1). Avyttring av anläggningar genomförs av FORTV efter att FM avvecklat sin verksamhet. FM avveckling och FORTV avyttring är samordnade i tid och rum där så är möjligt. FM nedläggningsplan anläggningar och FORTV avyttringsplan anläggningar är samordnade och är grundad på beslutad förbandsavveckling, enligt ubil 2.1. För ett antal objekt har beslut ännu inte fattats och utredning pågår. Kostnaderna för avveckling av anläggningar ingår i de kostnader som redovisas i de förbandstypsvisa uppdragen (underbilaga 2.1).

Beräknade kostnader för avveckling och avyttring av anläggningar innehåller osäkerheter som i nuvarande planeringsläge är svåra att förutse. Detta gäller i första hand kostnader för och omfattningen av olika miljöåtgärder samt entreprenadupphandlingar för avyttring.

Ny mobförrådsprincip innebär att ett stort antal förråd kan lämnas, vilket medför att den totala förrådkostnaden kommer att minska.

Kommentar till läget 2001-12-31

Volymen av nedläggningsobjekt är omfattande som en följd av FB 96 och regeringens beslut om FM omstrukturering 2000-03-30. Såväl FM som FORTV har nu väl inarbetade rutiner för avveckling och avyttring. Objekt som skall avvecklas ingår i Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar. Planen utgör underlag för avvecklingsuppdrag samt underlag för FORTV avyttring.

Verksamhetsuppdrag avseende nedläggning av anläggningar för 2001 gavs preliminärt i samband med att planen fastställdes och utsändes 2000-12-18. Slutliga verksamhetsuppdrag gavs ut under 1:a kvartalet 2001.

¹ En anläggning är en byggnad, utrymme eller iordningställt markområde t.ex. befästning, marin-, flyg-, övriga baser, förbindelser m.m, som (avses) redovisas i ett krigsförband.

Nedläggning av anläggningar med höga driftkostnader samt objekt skadliga för miljö resp de objekt som innebär risk för tredje man prioriteras. Hänsyn i planeringen sker även till kommande brist på kompetenser för avveckling inom specifika områden (sb-, vapensystem).

Kapaciteten inom såväl Försvarmakten som Fortifikationsverket har varit gräns-sättande i vissa fall och ett tiotal objekt har framflyttats till år 2002. Avsaknaden av regeringsbeslut om vilka objekt som slutligt skall bli statliga byggnadsminnen har varit hämmande på planering, avveckling och avyttring.

5.2 Avveckling av fastigheter²

Planen redovisar tidsplan för avveckling av fastigheter. För ett antal objekt har beslut ännu inte fattats och utredning pågår. Kostnaderna för avveckling av fastigheter ingår i de kostnader som redovisas i de förbandstypsvisa uppdragen (underbilaga 2.1).

Beräknade kostnader för avveckling av fastigheter innehåller osäkerheter som i nuvarande planeringsläge är svåra att förutse. Detta gäller i första hand kostnader för och omfattningen av olika miljöåtgärder.

Kostnader för avveckling av fastigheter förutsätter att regeringen medger att kvarvarande bokfört värde nedsätts till noll senast vid försäljningstillfället. Detta gäller även de förråd som förhyrs av grundorganisationen och som på sikt inte kommer att behövas.

Kommentar till läget 2001-12-31

Avvecklingen av fastigheter på avvecklingsorter går snabbare än planerat. Samtliga garnisoner som planerats att lämnas 2001-06-30 har lämnats på utsatt tid eller tidigare. Mindre förrådsdelar kommer att kvarstå till dess att materielen har avvecklats. Utfallet fram till 2001-12-31 är att Kristianstad är lämnat 2001-06-30 (tidigare angivet 2001-12-31) och A 8-området i Boden 2001-10-01 (tidigare angivet 2001-12-31).

Avvecklingen av Almnäs kommer att förskjutas tre år.

² En fastighet är en byggnad, lokal eller iordningställt markområde, t.ex. övnings- och skjutfält m.m. och som inte redovisas i ett krigsförband.

Ny mobiliseringsförrådsprincip innebärande att materiel förrådsställs i större förråd medför att ett stort antal gamla perifera förråd kan lämnas. Dock medför detta investeringar i nya centrala förråd. Flytt av redan tömda förrådsbyggnader till bland annat Boden planeras.

EN OMFATTANDE UTREDNING/BEREDNING INOM FÖRSVARSMAKTEN PÅGÅR AVSEENDE VILKEN MARK OCH VILKA FASTIGHETER FÖRSVARSMAKTEN LÅNGSIKTIGT BÖR FÖRHYRA. BEREDNINGEN BEDÖMS VARA SLUTFÖRD UNDER TREDJE KVARTALET 2002.

6 TOTALHYRA ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

./Ubil 2.5

Budgetvärden som återfinns i underbilaga 2.5 är lämnade i särskild ordning av respektive chef för respektive, anläggnings- och fastighetskontor (C ANFA-kontor).

REDOVISNING TIDSPLAN SAMT AVVECKLINGSKOSTNADER

FÖRBANDSTYP 1 (OPERATIVA LEDNINGS- OCH UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En militärområdestransportbataljon	2001	2001	
Två transportkompanier	1999	2000	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre militärområdesstaber med stabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Fem militärområdesambandsbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex militärområdesssäkerhetskompanier	2001	2004-12-31	
Tre underhållsregementsstaber med stabsförband	2001	2004-12-31	
Sju underhållsgruppstaber med stabskompanier	2001	2004-12-31	
Sex militärområdesförsörjningskompanier	2001	2004-12-31	
Fjorton militärområdesförrådskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra militärområdesverkstadskompanier	2001	2004-12-31	
Fjorton militärområdesreparationskompanier	2001	2004-12-31	
Tio transportkompanier	2001	2004-12-31	
Två fordonstransportkompanier	2001	2004-12-31	
Sex militärområdestransportbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex markteleunderhållsbataljoner	2001	2004-12-31	
Etthundratrettiofyra transportledningsgrupper	2001	2004-12-31	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
HKV	2000-07-01	2001-12-31	
S 1 med LedS och TSS		2000-07-01	Klart 00-07-01

Organisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
OPII med ATK, MTK, FTK		2004-12-31	<i>Progn 05-06-30</i>
FMLOG (varvid verksamheten vid Uhreg S, -M, -N, Uhgrp G, ÖVM, FMF, MSK, FMUHC anpassas och integreras i FMLOG)	2001-01-01	2002-01-01	

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Armécentrum	2000-06-30	2000-06-30	Klart 00-06-30
Milostab S	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Milostab M	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Milostab N	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Uhreg S (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	
Uhreg M (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	
Uhreg N (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	
Uhgrp G (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	
S 3 (Norrlands signbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	51	173	103	139
Utfall 2001-12-31	148	186	170	180
Differens	-97	-13	-67	- 41

FÖRBANDSTYP 2 (DIVISIONSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre fördelningsstaber med betjäningsförband	1997	2004-12-31	
Tre artilleriregimentsstaber med betjäningsförband	1997	2004-12-31	
Åtta fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F	1997	2004-12-31	
Tio luftvärnsbataljoner 48	1997	2004-12-31	Del till Baltikum
Tre fördelningsunderrättelsekompanier	1997	2004-12-31	
Två militärpoliskvadroner	1997	2004-12-31	
Två militärpolis kompanier	1997	2004-12-31	
Sex fördelningsingenjörbataljoner	1997	2004-12-31	
Två norrlandsfördelningsingenjörbataljoner	1997	2004-12-31	
Fyra jägarbataljoner	1997	2004-12-31	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre fördelningsstaber med fördelningsstabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Tre artilleriregimentsstaber med artilleriledningskompanier	2001	2004-12-31	
En artilleriregimentsstab G med artilleriledningskompani	2001	2004-12-31	
Fem artillerilokaliseringsskvadroner ARTHUR	2001	2004-12-31	
Tre televapenkompanier	2001	2004-12-31	
Tre fördelningsunderrättelsekompanier	2001	2004-12-31	
En TTAS (inarbetas i OPIL)	2001	2004-12-31	
Tre fördelningsUAVplutoner	2001	2004-12-31	
Två fallskärmsjägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex jägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Tolv norrlands jägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Åtta militärpolis kvadroner	2001	2004-12-31	
Två fördelningspansarvärnskompanier robot 55	2001	2004-12-31	
Två fördelningskanonbataljoner	2001	2004-12-31	
Två fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F	2001	2004-12-31	
Fyra norrlandsfördelnings- och fördelningshaubitsbataljoner 77A	2001	2004-12-31	
Fyra fördelningshaubitsbataljoner 77B	2001	2004-12-31	
Två fördelningsluftvärnsbataljoner robot 70	2001	2004-12-31	
Tio fördelningsluftvärnsbataljoner robot 70/90	2001	2004-12-31	
Två divisionsingenjörbataljoner	2001	2004-12-31	
En norrlandsdivisionsingenjörbataljon	2001	2004-12-31	
Tre förbindelsebataljoner	2001	2004-12-31	
Två brokompanier F	2001	2004-12-31	
Två ammunitionsröjningstroppar	2001	2004-12-31	
Tjugosex fältsjukhus	2001	2004-12-31	
Tolv sjukhustransportplutoner	2001	2004-12-31	

Fyra sjukvårdsförstärkningskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra militärpolis kompanier	2001	2004-12-31	
Fyra trafikkompanier	2001	2004-12-31	
Två stridsvagnstransportkompanier	2001	2004-12-31	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
K 3		2000-07-01	Klart 00-07-01
K 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
A 9 med ArtSS		2000-07-01	Klart 00-07-01
Lv 6 med LvSS	2000-07-01	2001-07-01	Klart 01-01-01
Ing 2 med FarbS		2000-07-01	Klart 00-07-01
T 2		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
4.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
6.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
13.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 22/Gj 66	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
K 1 (inordnas i Livgardet - LG)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
A 3	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
A 7	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
A 8 (Norrlands artbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
Lv 2	2000-08-31	2001-12-31	Klart 01-06-30
Lv 3	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
Lv 7 (Norrlands lvbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Ing 3 (Norrlands ingbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
T 3 (Norrlands trängbat inordnas i I 5)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	140	20	3	3
Utfall 2001-12-31	35	17	4	3
Differens	105	3	-1	0

FÖRBANDSTYP 3 (NATIONELLA SKYDDSTYRKOR)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Elva försvarsområdesstaber	1997	2004-12-31	
Stabsförband till elva försvarsområdesstaber (utgör ram till förstabsbat/komp)	1997	2004-12-31	
Fyra gränsskyttebataljoner	1997	2004-12-31	
Fem försvarsområdeshaubitsbataljoner	1997	2004-12-31	
Femton försvarsområdeshaubitskompanier	1997	2004-12-31	
Tjugofem fortgrupp 90	1997	2004-12-31	
Tjugosex försvarsområdesunderhållskompanier	1997	2004-12-31	
Trettio två fotplutoner	1997	2004-12-31	
Tjugo försvarsområdesgruppsstaber C	1997	2004-12-31	
Tjugtre försvarsbataljoner	1997	2004-12-31	
Tjugotvå försvarskompanier	1997	2004-12-31	
Tvåhundrafemtio försvarsplut	1997	2004-12-31	
Sjuttiosju värnkompanier	1997	2004-12-31	
Sjutton värnplutoner	1997	2004-12-31	
Två lkanbat	1997	2004-12-31	
Sex lfkankomp	1997	2004-12-31	
Sju depåer	1997	2004-12-31	
Fjorton fospecialkomp	1997	2004-12-31	
Tjugosju fältpostkontor	1997	2004-12-31	
Ersättningsförband	1997	2004-12-31	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MKG stab med stabsbataljon	2001	2004-12-31	
Tretton försvarsområdesstaber	2001	2004-12-31	
Tjugotre försvarsområdesstabsbataljoner/-kompanier	2001	2004-12-31	
Två gränsjägerstaber med gränsjägerstabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Fyra gränsregementsstridsgruppstaber	2001	2004-12-31	
Trettio tre försvarsområdesgruppstaber typ A	2001	2004-12-31	
Två försvarsområdesgruppstaber typ G	2001	2004-12-31	
Fyrtioen försvarsområdesgruppstaber typ B	2001	2004-12-31	
Försvarsområdesgruppstab Boden	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdeskyttebataljoner	2001	2004-12-31	
Åtta försvarsområdeskyttebataljoner N	2001	2004-12-31	
Åtta gränsskyttebataljoner	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdesingenjör-/pionjärkompanier	2001	2004-12-31	
Tio försvarsområdesförbindelsekompanier	2001	2004-12-31	
Trettio fortgrupper 90	2001	2004-12-31	
Fyra gränsunderhållskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra gränssjukvårdskompanier	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdesluftvärnskompanier	2001	2004-12-31	
Nitton försvarsområdesunderhållskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra krigssjukhus	2001	2004-12-31	

Sex gränsingenjörbataljoner 94 R	2001	2004-12-31	
----------------------------------	------	------------	--

Organisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MD-stab Göteborg med MD-grupperna :	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Blekingegruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Södra skånska gruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Skånska dragongruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Norra smålandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Kronobergsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Kalmargruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Hallandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Göteborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Älvsborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Bohus-Dalsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Skaraborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
MD-stab Stängnäs med MD-grupperna :	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Livgrenadjärgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Södermanlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Södertörnsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Livgardesgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Upplandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Upplandsgruppen omlokaliseras till Enköping	2001-07-01	2001-10-01	Klart 01-10-01
Västmanlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Livregementets grenadjärgrupp	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Värmlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Dalregementsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Gävleborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
MD-stab Boden med MD-grupperna :	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Jämtlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Västernorrlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Härnösandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Västerbottensgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Norbottensgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Lapplandsjägargruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Norbottens gränsjägargrupp	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
MD-stab Visby med MD-grupp :	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Gottlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
HvSS	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MKG och Gottlands militärkommandostab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 1/Fo 44	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
I 2/Fo 52	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 3/Fo 51	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
I 12/Fo 17	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 13/Fo 53	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 16/Fo 31	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
I 20/Fo 61	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
I 21/Fo 23	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
P 2/Fo 14	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
P 10/Fo 43	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
S 1/Fo 47	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
Fo 63	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
MKS/Fo 15	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
MKV/Fo 32	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Gj 67	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Tio försvarsområdesgrupper		2000-06-30	Klart 00-06-30
RiksHvC (inordnas i HKV)		2000-06-30	Klart 00-06-30

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	277	22	24	31
Utfall 2001-12-31	49	19	68	33
Differens	228	3	-44	-2

FÖRBANDSTYP 4 (ARMÉBRIGADFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Livgrenadjärbrigaden (IB 4)	1997	2004-12-31	
Älvsborgsbrigaden (IB 15)	1997	2004-12-31	
Lapplandsbrigaden (NB 20)	1997	2004-12-31	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En IB 90/302	2001	2004-12-31	
Tre IB 501	2001	2004-12-31	
Tre NB 90/401	2001	2004-12-31	
En MekB 104/302	2001	2004-12-31	
Tre MekB 121/302	2001	2004-12-31	
Två MekB 122/90	2001	2004-12-31	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Livgardet - LG		2000-07-01	Klart 00-07-01
I 5 inkl nträngbat		2000-07-01	Klart 00-07-01
I 19 inkl nart-, nlv-, ning- och nsignbat		2000-07-01	Klart 00-07-01
P 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
P 7		2000-07-01	Klart 00-07-01
P 10		2000-07-01	Klart 00-07-01
P 18		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
IB 1 (inordnas i LG)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
IB 2	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
IB 12	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
IB 16	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
NB 13	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
NB 21	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
MekB 8	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	161	14	46	<i>41</i>
Utfall 2001-12-31	31	13	98	<i>28</i>
Differens	130	1	-52	<i>13</i>

FÖRBANDSTYP 5 (MARINA LEDNINGS- OCH UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Nio marina stridssjukhus 1)	1997	1999	Klart 00-12-31

1) Var ursprungligen fyra, men ytterligare MASS skall avvecklas, varvid fältsjukhusen behålls

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Fyra marinkommandostaber	2001	2004	
En rörlig marin ledningsgrupp (RML)	2001	2004	Prog 2003
Fyra marina underhållsbataljoner	2001	2004	2 st klara
Två marina underhållskompanier	2001	2004	Prog 2003
Sex bassäkerhetskompanier	2001	2004	
Sex sjuktransportkompani sjö	2001	2004	
Tre marina sjukhuskompanier (Gotland)	2001	2004	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
ÖVM (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	

Organisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MarinB S		2000-07-01	Klart 00-07-01
MarinB O		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Marincentrum		2000-06-30	Klart 00-06-30
MKO	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-10-01
MKN	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	35	47	30	60
Utfall 2001-12-31	94	55	64	72
Differens	-59	-8	-34	- 12

FÖRBANDSTYP 6 (FÖRSVARSMAKTENS HELIKOPTERFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En rörlig helikopterledning	2001	2004-12-31	
En arméflygbataljon	2001	2004-12-31	
Två pansarvärnshelikopterkompanier	2001	2004-12-31	
Två fördelningshelikopterkompanier	2001	2004-12-31	
Fyra fördelningshelikopterplutoner	2001	2004-12-31	
Två helikopterdivisioner 98	2001	2004-12-31	
En helikopterbaspluton	2001	2004-12-31	
Sex flygräddningsgrupper	2001	2004-12-31	
Sex stationsplutoner	2001	2004-12-31	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
FM Hkpljstabs (med 1.Hkpskv i Boden)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
2.Hkpmat	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
4.Hkpmat	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
1.Hkpskv	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
1.Hkpmat	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
3.Hkpmat	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	4	9	17	16
Utfall 2001-12-31	16	9	29	19
Differens	-12	0	-12	- 3

FÖRBANDSTYP 7 (STRIDSFARTYGSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Sex robotbåt typ Ystad (avv i takt med överför t. Visby-systemet)	2001	2006	Prel sluttid
Two patrullbåt typ Kaparen	2003	2004	
Fyra patrullbåt typ Kaparen (")	2006	2007	Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Kaparen (")	2008	2009	Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Hugin	2001	2002	
Tre minkrigsavdelningsstaber	2001	2004	
Fyra minsvepningsförband	2001	2004	
Ett minröjningsfartyg typ Landsort (bibe e. -04 som tillväxtresu)	2001	2004	
Two minröjningsfartyg mindre typ Styrso (ges utökad röjdyk-kapacitet och ingår därefter i insatsorg som röjdykarfartyg)	2001	2004	
Sex röjningsdykarfartyg	2001	2004	
Ett stamminfartyg/ledningsfartyg (övergår till att vara lagfartyg)	2001	2002	
Tre isbrytare	2001	2003	
Tre isbrytare	2002	2003	
Two ubåtar typ Västergötland (bibe e. -04 som tillväxtresurs)	2004	2006	Prel sluttid
Two ubåtar typ Näcken	2001	2004	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
1. Ubflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
2. Ysflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
3. Ysflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
4. Minkrifj		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	9	11	2	8
Utfall 2001-12-31	4	8	22	12
Differens	5	3	-20	-4

FÖRBANDSTYP 8 (KUSTFÖRSVARSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Two marinregementen	1997	1999	Klart 01-12-31 1)
Sju kustförsvarsbataljoner	1997	1999	Klart 01-12-31 1)

1) Begränsade delar återstår

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Två kustartilleribrigadledningar	2001	2004-12-31	
Tre amfibiebataljoner (en förrådsställs med OE-materiel)	2001	2004-12-31	
Tre kustartilleribataljoner 12/80 (två förrådsställs med OE-mtrl)	2001	2004-12-31	
Ett tungt kustrobotbatteri	2001	2004-12-31	Progn 03-12-31
Fyra marinregementen	2001	2004-12-31	
Sex kustförsvarsbataljoner	2001	2004-12-31	
Tre tunga batterier 12/70	2001	2004-12-31	
Tre tunga batterier 10,5/50	2001	2004-12-31	Progn 03-12-31
Nio lätta batterier 7,5/57	2001	2004-12-31	
Sex amfibiekompanier	2001	2004-12-31	
Fyra minutläggningsdivisioner	2001	2004-12-31	
Sexton skärgårdsskyttekompanier	2001	2004-12-31	
Två luftvärnsrobotkompanier robot 70	2001	2004-12-31	
Tre luftvärnkompanier 40/48	2001	2004-12-31	
Femton lätta kustrobotbatterier	2001	2004-12-31	

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
1.Amfibieregementet		2000-07-01	Klart 00-07-01
4.Amfibieregementet		2000-07-01	Klart 00-07-01
KAS omorganiseras till AmfSS	2000-07-01	2000-12-31	Klart 00-12-31
AmfSS flyttar till Rindö		2001-12-31	Klart 01-12-31

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
KA 2	2000-10-31	2001-12-31	Klart 01-06-30
KA 3	2000-10-31	2001-12-31	Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	21	12	22	41
Utfall 2001-12-31	48	19	60	50
Differens	-27	-7	-38	- 9

FÖRBANDSTYP 9 (FLYGVAPNETS LEDNINGS- O UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre flygkommandostaber med stabsförband	2000-07-01	2001-12-31	
En vädercentral	2001	2001-12-31	
Tre stridsledningsbataljoner	2001	2001-12-31	
Sexton basbataljoner 85	2001	2003-12-31	Prog 02-12-31
Sex depåförband	2000-07-01	2001-12-31	
En depåflottiljverkstad	2000	2001-12-31	
En depåflottiljverkstad	2002	2002-12-31	Avvecklas ej

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
F 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
F 7		2000-07-01	Klart 00-07-01
F 16		2000-07-01	Klart 00-07-01
FlygS 1)		2003-12-31	
F 17		2000-07-01	Klart 00-07-01
F 20		2000-07-01	Klart 00-07-01
F 21		2000-07-01	Klart 00-07-01
FMF (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	

1) GFU (grundläggande flygutbildning) omlokaliseras till F 16 2003-01-01 och 2003-08-01 till Malmen. GTU (grundläggande taktisk utbildning) omlokaliseras till Malmen senast 2003-12-31.

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Flygvapencentrum		2000-06-30	Klart 00-06-30
FK S	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
FK M	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
FK N	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
F 10	2002-12-31	2003-12-31	
F 16	2003-12-31	2004-12-31	

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	51	6	3	19
Utfall 2001-12-31	9	8	75	55
Differens	42	-2	-72	- 36

FÖRBANDSTYP 11 (ÖVRIGA STRIDSFLYGFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Sex JA 37-divisioner	2001	2002-12-31	
Två JA 37-divisioner	2002	2003-12-31	
En AJS 37-division inkl SK 37E	2003	2003-12-31	Progn 05-12-31

Avvecklingskostnader	1998	1999	2000	2001
Budget	7	1	0	9
Utfall 2001-12-31	1	1	5	9
Differens	6	0	-5	0

FÖRBANDSTYP 13 (FÖR KRIGSORGANISATIONEN GEMENSAMT)

13.1

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MHS K		2000-07-01	Klart 00-07-01
MHS H		2000-07-01	Klart 00-07-01
MHS Ö		2000-07-01	Klart 00-07-01
FMHS		2000-07-01	Klart 00-07-01
SkyddC		2000-07-01	Klart 00-07-01
SWEDINT och flytta till Kungsängen		2003-10-01	<i>Progn 04-04-01</i>
FM UndSäkC		2000-07-01	Klart 00-07-01
RekryC		2000-07-01	Klart 00-07-01
FSC		2000-07-01	Klart 00-07-01
FMC		2000-07-01	Klart 00-07-01
FöMusC		2000-07-01	Klart 00-07-01
MSK (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	
FKSC (inordnas i OPIL)		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
FMUhC (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	
FMLIC (funktioner till MHS H, MHS K och K 3)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31

13.2

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
SWEDEC		2000-07-01	Klart 00-07-01
ArtSS (inordnas i A 9)		2000-07-01	Klart 00-07-01
LvSS flyttar 2001-07-01 till Halmstad (inordnas i Lv 6)	2000-07-01	2001-07-01	Klart 00-12-31
MSS		2000-07-01	Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
LedC (omorg till LedS och inordnas i S 1)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01

13.3

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
ÖS		2000-07-01	Klart 00-07-01
ÖS (flyttning av ledning från Berga till Karlskrona)	2001-06-01	2001-07-01	Klart 01-06-30
ÖS (flyttning Bassäkkomp samt etablering på Kungsholmen)	2001-04-15	2001-12-31	<i>Klart 01-12-31</i>

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
SSS (verksamheten överförs till ÖS)		2000-07-01	Klart 00-07-01

13.4

Omorganisera följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm

Avvecklingskostnader Fbtyp 13	1998	1999	2000	2001
Budget	107	91	127	<i>275</i>
Utfall 2001-12-31	383	86	168	<i>194</i>
Differens	-276	5	-41	<i>81</i>

FÖRBANDSTYP 14 (FÖR GRUNDORGANISATIONEN GEMENSAMT)

14.1

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

14.2

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

14.3

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

Avvecklingskostnader Fbtyp 14	1998	1999	2000	2001
Budget	85	278	1 138	<i>1 718</i>
Utfall 2001-12-31	365	273	1 581	<i>1 839</i>
Differens	-280	5	-443	<i>- 121</i>

TOTALT FÖRSVARSMAKTEN

Avvecklings- kostnader	Utfall 1998	Utfall 1999	Utfall 2000	Budget 2001	Utfall 01-12-31	Differen- s	Anmärk- ning
Förbandstyp 1	148	186	170	<i>139</i>	<i>180</i>	<i>- 41</i>	
Förbandstyp 2	35	17	4	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	
Förbandstyp 3	49	19	68	<i>31</i>	<i>33</i>	<i>- 2</i>	
Förbandstyp 4	31	13	98	<i>41</i>	<i>28</i>	<i>13</i>	
Förbandstyp 5	94	55	64	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>- 12</i>	
Förbandstyp 6	16	9	29	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>- 3</i>	
Förbandstyp 7	4	8	22	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>- 4</i>	
Förbandstyp 8	48	19	60	<i>41</i>	<i>50</i>	<i>- 9</i>	
Förbandstyp 9	9	8	75	<i>19</i>	<i>55</i>	<i>- 36</i>	
Förbandstyp 10	0	0	0	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>- 1</i>	
Förbandstyp 11	1	1	5	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	
Förbandstyp 12		0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Förbandstyp 13	383	86	168	<i>275</i>	<i>194</i>	<i>81</i>	
Förbandstyp 14	365	273	1 581	<i>1 718</i>	<i>1 839</i>	<i>- 121</i>	
Förbandstyp 15	0	0	8	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	
Försvarsmakten totalt	1183	694	2 352	<i>2 364</i>	<i>2 498</i>	<i>- 134</i>	

**REDOVISNING PERSONALAVVECKLING, VOLYMER OCH
KOSTNADER INTILL 2001-12-31**

Avgångar yrkesofficerare

	1999	2000	2001	Prognos/ Anmärkning för år 2001
Planerat	927	1 555	1 220	
Utfall	917	1 391	1 326	
Differens	-10	- 164	106	

Rekrytering yrkesofficerare

	1999	2000	2001	Prognos/ Anmärkning för år 2001
Planerat	415	355	428	Anställs efter examen vid skolor
Utfall / prognos	398	333	338	H-delen anställda efter examen i juni
Differens	-17	- 22	- 90	

Kostnader för avveckling av yrkesofficerare

	1999 (Mkr)	2000 (Mkr)	2001 (Mkr)	Prognos/ Anmärkning för år 2001
Planerat 1)	499	690	998	
Utfall	497	1 103	1 079	Exkl flyttnings- och pendlingskostnader
Differens	+2	- 413	- 81	

1) Budget/Utfall för SPB/ SP och yrkesväxlingsåtgärder (konto 4013, 431 (kassa 103.4 aktivitet 50517, 50519), 432 och 433)

Antalet reservofficerare

	1999	2000	2001	Prognos/ Anmärkning för år 2001
Planerat	13 200	11 700	8 500	Antalet utgör behovet (prel) from 2002
Utfall	11631	11 987	12 020 2)	Antal RO med ”nya avtalet”
Differens	-1569	+ 287	+ 3 520	

2) Utöver ovan redovisade antal för 2001 finns ca 4 000 RO tillhörande äldre förordningar

Civil personal

	1999	2000	2001	Prognos/ Anmärkning för år 2001 3)
Planerat	8878	8 450	8 672	
Utfall	8825	8 948	8 731	
Differens	- 53	+ 498	+ 59	

3) Redovisningen presenteras i form av förbrukning av årsarbete för civil personal.


Kostnader för avveckling av civil personal

	1999	2000	2001	Prognos/ Anmärkning för år 2001
Planerat	11	22	216	

Utfall	4)	4	127	343	
Differens		7	- 105	- 127	

4) Budget/ utfall lön under avveckling och pensionskostnader (konto 4017 och 431 (kassa 103.4 aktivitet 50516))

TIDSPLAN FÖR FÖRNÖDENHETSÄVVECKLING

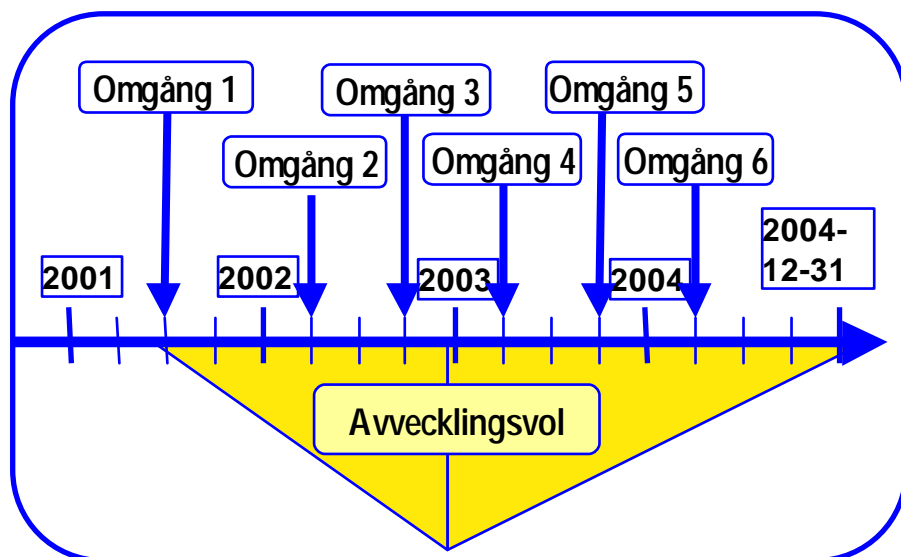

Ovan redovisas tidsplan för avveckling av överflödiga krigsorganisatoriska förnödenheter.

Inriktningen är att genomföra två försäljningar per år där sommaromgången inriktas på fordonsmateriel och annan skrymmande materiel och vinteromgången på styckegodsmateriel. Såväl antalet försäljningsomgångar som sammansättningen analyseras fortlöpande och kommer att revideras i den utsträckning som analyserna kräver. Detaljplaneringen av avvecklingen genomförs årsvis och bygger på så kallade BTD-analyser. Dessa analyser grundas på i KRO-systemen och i TOR-C aviserade behov och redovisade tillgångar. Denna avisering sker årsvis och detta begränsar möjligheterna till planering på längre sikt. Orsaken till detta är att redovisningssystemen inte medger längre perspektiv enligt tidigare beskrivning. Amavvecklingsplanen sträcker sig till andra kvartalet 2004 och rullas årligen.

**REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR
AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER**

Avveckling ortvis, blandade förbandstyper

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Kristianstad	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-05-31
Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Rosenholm	2000-07-01	2001-12-31	
Fårösund	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Almnäs	2000-07-01	2002-12-31	Progn 04-04-01
Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Umeå	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-06-30
Boden	2000-07-01	2001-12-31	<i>Progn 01-09-30</i>
Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Spridda förråd (successivt fram till 2004)	2000-07-01	2004-12-31	

Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Drivmedelsanläggningar			1) 2)
Drivmedelsförråd			1)
Ammunitionsförråd			1)
Materieförråd			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

2) "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring ej klar.

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MFD Delary	1997	1999	Progn 02-06-30
HKV Stockholm	1998	2000	Omorganisation klar

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
HKV Stockholm	1998	2000	Ingen investering

Förbandstyp 2 (Divisionsförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 22/Gj 66 i Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Lokaler och övningsfält för MD-grp bibehålls
A 3 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Lv 3 i Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbana och <i>delar av tidigare</i> övningsfält för HvFriv bibehålls
T 3 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30

Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Armé batterier			1)
Truppbefästningar			1)
KV-annex			1)
RA-annex			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 13/Fo 53 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Lokaler samt övnings- och skjutfält för MD-grp bibehålls
I 21/Fo 23 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	” Klart 01-06-30
P 2/Fo 14 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbana bibehålls <i>Lokaler för MD-grp bibehålls</i>

Förbandstyp 4 (Armébrigadförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
NB 13 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
NB 21 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
MekB 8 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30

Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Ledning, staber			1)
Drivmedelsförråd			1)
Ammunitionsförråd			1)
<i>Minförråd</i>			1)
<i>Torpedförråd / -verkstad</i>			1)
Krigsförtöjningsplatser			1)
Ksrr			1)
Truppbefästningar			1)
Trr			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MTC i Berga	1998	2000	Progn 03-12-31
HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i Härnösand	1997	1998	Varav kvarvarande delar ingår i MarinB O och MD G Härnösand Progn 01-12-31

Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Förrådsställda krigsförband	1997	1999	Progn 04-12-31

Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Huvuddelen av kustartillerianläggningar	1997		1) 2)
Ledning, staber			2)
T batt			2)
L batt			2)
Lv			2)
Mätstn			2)
Minstn			2)
Ksrr			2)
Uv-span			2)

Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn			2)
Förråd			2)
Krigsförtöjningsplatser			2)
Slingstn			2)
Nsrr			2)
Div äldre objekt / skansar mm			2)
Artobs			2)
Strålkastare			2)
Värmpjäser			2)
SIS			2)
Signalannex			2)

1) Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden.

2) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
KAC i Näsby Park	1998	2000	Klart 01-12-31
Förrådsställda krigsförband	1997	1999	Progn 04-12-31
KA 3 i Fårösund	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbanor <i>och delar av tidigare</i> övningsfält bibehålls för MD G

Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
LFC			1)
Stabsplatser/ledning			1)
FSKRC			1)
RGC/RRGC			1)
Ps 66 / 65			1)
Ps 15			1)
RSA			1)
Flygbaser			1)
BasC, KC			1)
Drivmedelsanläggningar			1)
Truppbefästningar			1)
Tjära			1)
N-plats			1)
FTN			1)

<i>Optisk luftbevakning / LS-torn</i>			1)
Ammunitionsförråd			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling huvuddelen av:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FTC på Malmen	1998	2000	Progn 2002

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FlygvapenC i Uppsala	1998	2000	Avvaktas tillsvidare

Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
VIP-tpresurserna på Bromma	1998	2000	Avvecklas ej
Signal- och radarspaningen på Malmen	1998	2000	Avvecklas ej

För Bromma och Malmen finns nya avtal gällande t o m 2002.

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Signal- och radarspaningen samt VIP-transportresurserna i Uppsala	1998	2000	Ingen investering

Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MOHS i Karlskrona	1998	2000	Numera i ÖS

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
UndSäkC vid F 16 i Uppsala	1997	1998	Progn 02-12-31

Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen

	1999 (Mkr)	2000 (Mkr)	2001 (Mkr)	Prognos / Anmärkning
Budgeterat	8,2	7,1	5,2	
Utfall 2001-12-31	7,3	8,1	5,1	
Differens	0,9	- 1,0	0,1	

TOTALHYRA ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

Anläggnings- och fastighetsverksamhet enligt 2001 års indelning

Område	Utfall 1998	Not	Utfall 1999	Not	Utfall 2000	Not	Budget 2001	Not	Utfall 2001-12-31	Not
Administration	154 603	1)	86 272	1)	121 484	1)	132 269	3)	119 285	1)
Inhyring från FORTV	2 332 784	1)	2 489 185	1)	2 417 841		2 298 472	3)	2 292 183	
Inhyring från andra fastighetsägare	308 970	1)	256 708	1)	202 483		346 458	3)	349 459	
Extern uthyrning	-66 650	2)	-67 680	2)	-81 608		- 41 622	3)	- 41 396	2)
Tilläggs- och service-tjänster	274 827	1)	175 179	1)	142 275	1)	199 455	3)	209 580	1)
Omstrukturering	31 725	1)	13 455	1)	63 495	1,6)	77 338	3,6)	46 563	1,6)
Avveckling anläggningar					34 098	6)	9 600	3,6)	6 731	6)
Ny-/om-/tillbyggnad av krigsanläggningar	231 171	1)	184 119	1,5)	55 995	1,5)	0	1,5)	0	1,5)
Summa	3 267 430		3 137 238		2 956 063		3 021 970		2 982 405	7)

- 1) I redovisat utfall är såväl externa som interna kostnader minskade med eventuella intäkter, ingen koncerneliminering har gjorts.
- 2) Det redovisade utfallet är intäkter (minskade med vissa smärre kostnader som bokförts på denna verksamhet), ingen koncerneliminering har gjorts.
- 3) Beloppen är lämnade i särskild ordning av respektive C ANFA-kontor (chef för anläggnings- och fastighetskontor) och inte de belopp som finns i FS Koncern.
- 4) Budget enligt FS Koncern.
- 5) Enbart kostnader, inga intäkter.
- 6) Redovisades tillsammans tidigare.
- 7) *Under 2001 omfattade förhyrda objekt 5 259 544 m² BTA.*
